

PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG

NOTA DINAS

Kepada Yth : 1. Sdr. Sekretaris dan Kasubag pada Sekretariat
2. Sdr. Kepala Bidang dan Pejabat Fungsional pada Bidang Sumber Daya Air
3. Sdr. Kepala Bidang dan Pejabat Fungsional pada Bidang Bina Marga
4. Sdr. Kepala Bidang dan Pejabat Fungsional pada Bidang Bidang Tata Ruang
5. Sdr. Bidang dan Pejabat Fungsional pada Bidang Kepala Bidang Pertanahan
6. Sdr. Kepala UPT Pengelolaan Jalan, Jembatan dan SDA Wilayah Selatan
7. Sdr. Kepala UPT Pengelolaan Jalan, Jembatan dan SDA Wilayah Utara
di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

Dari : Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

Tanggal : 15 Juli 2025

Nomor : 005/306/437.51/2025

Perihal : Undangan

Sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan program kerja pada Dinas PUTR yang sudah memasuki bulan Juli Tahun 2025, maka bersama ini dimohon dengan hormat kehadiran Saudara pada:

Hari : Rabu
Tanggal : 16 Juli 2025
Pukul : 08.30 WIB - Selesai
Tempat : Ruang Rapat Buldozer Lt 2
Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kab. Gresik
Acara : Rapat Koordinasi Evaluasi Semester I APBD Tahun 2025

Demikian atas perhatian dan kehadirannya disampaikan terima kasih.

**KEPALA DINAS
PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG**



DHIANNITA TRI ASTUTI, ST, M.MT





Pembina Tk. I

NIP. 19730416 199901 2 002


DAFTAR HADIR
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG KABUPATEN GRESIK

Hari / Tanggal : Rabu/ 16 Juli 2025
Jam : 08.30 WIB - selesai
Tempat : Ruang Rapat Bulldozer LT. 2
Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Gresik
Acara : Rapat Koordinasi Evaluasi Semester I APBD Tahun 2025
Kd. Belanja : KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD
(1.03.01.2.01.0006)

NO	NAMA	L/P	UNIT KERJA	TANDA TANGAN
1	Dhiannita T.	P	Idaris PUTR	1.....
2	Tri Handayani S	P	Sudin	2.....
3	BUDI PW	L	UPT SELATAN	3.....
4	Prio Santoso	L	Icen	4.....
5	Abdul Munir	L	Tan	5.....
6	Era Y.	P	Tan	6.....
7	Ismahyuman A	L	PUTR	7.....
8	Suryani		DPUR	8.....
9	Sn Wulansari	P	Tan	9.....
10	Elita Melinda	P	Tanah	10.....
11	Eddy Puncoro	L	BMA	11.....
12	ANDIK W	L	SDA	12.....
13	NUNIK	P	SDA	13.....
14	ZUS NIA	P	Uaum Kep	14.....
15	Guharianti	L	Tanah	15.....
16	M. Arif Setiawan	L	SDA	16.....
17	Uban Dilla	L	SDA	17.....
18	Achmad Rochi	L	umpu	18.....
19	Dyaning Si P	P	Tan	19.....
20	Wendy P. A	P	BM	20.....

NO	NAMA	L/P	UNIT KERJA	TANDA TANGAN
21	PUPIN AHMADI	L	BM	21..... 
22	Dyah Riza	P	BM	22..... 
23	Idha D	L	BM	23..... 
24	GRESIKA . P	P	BM	24..... 
25	Dudik	L	PP	25..... 
26	M. HENDRY	L	Progam	26..... 
27	Husni M	L	PP	27..... 
28	Ganik. k.	P	PP	28..... 
29	Nurma C	P	PP	29..... 
30	Vinanti D K	P	PP	30..... 
31	Maya Putri, A	P	PP	31..... 
32				32.....
33				33.....
34				34.....
35				35.....
36				36.....
37				37.....
38				38.....
39				39.....
40				40.....

Mengetahui,
KUASA PENGGUNA ANGGARAN


TRI HANDAYANI SETYARINI, ST

NIP. 19700823 199803 2 002

PEJABAT PELAKSANAAN TEKNIS KEGIATAN


M. HENDRY PANGGABEAN, ST

NIP. 19760808 200801 1 009

NOTULEN RAPAT

Dasar : Nota Dinas Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kab. Gresik Nomor : 005/306/437.51/2025 tanggal 15 Juli 2025.
Hari, Tanggal : Rabu, 16 Juli 2025
Waktu : 08.30 WIB – Selesai
Tempat : Ruang Rapat Buldozer Lt 2
Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kab. Gresik
Acara : Rapat Koordinasi Evaluasi Semester I APBD tahun 2025
Dihadiri oleh : Terlampir

RINGKASAN HASIL RAPAT:

1. Progres keuangan masih rendah, perlu dilakukan peningkatan progres keuangan dari masing - masing bidang.
2. Tahun ini masih difokuskan pada pembangunan jalan, namun nantinya akan bergeser untuk ketahanan pangan.
3. Diharapkan tiap bidang menyediakan buku kerja untuk dilaporkan kepada atasan / pimpinan masing – masing.
4. Paket pekerjaan fisik untuk normalisasi dan rehabilitasi waduk agar dievaluasi kembali, mengingat waktu pelaksanaan dan cuaca yang masih masuk pada kemarau basah.
5. Agar pekerjaan fisik dipercepat supaya tidak terlalu jauh dari target yang sudah ditentukan.
6. Agar setiap melakukan monitoring di lapangan, pengawas dari intern sering ikut mendampingi supaya dapat menaikkan pendapatan hasil Laboratorium
7. Bidang sumber daya air diharapkan lebih sering melakukan monitoring dan evaluasi di lapangan untuk mengetahui kondisi waduk dan anak sungai terkini.
8. Secara umum progress fisik dan keuangan akan disampaikan terlampir.

Gresik, 16 Juli 2025

Nomlis

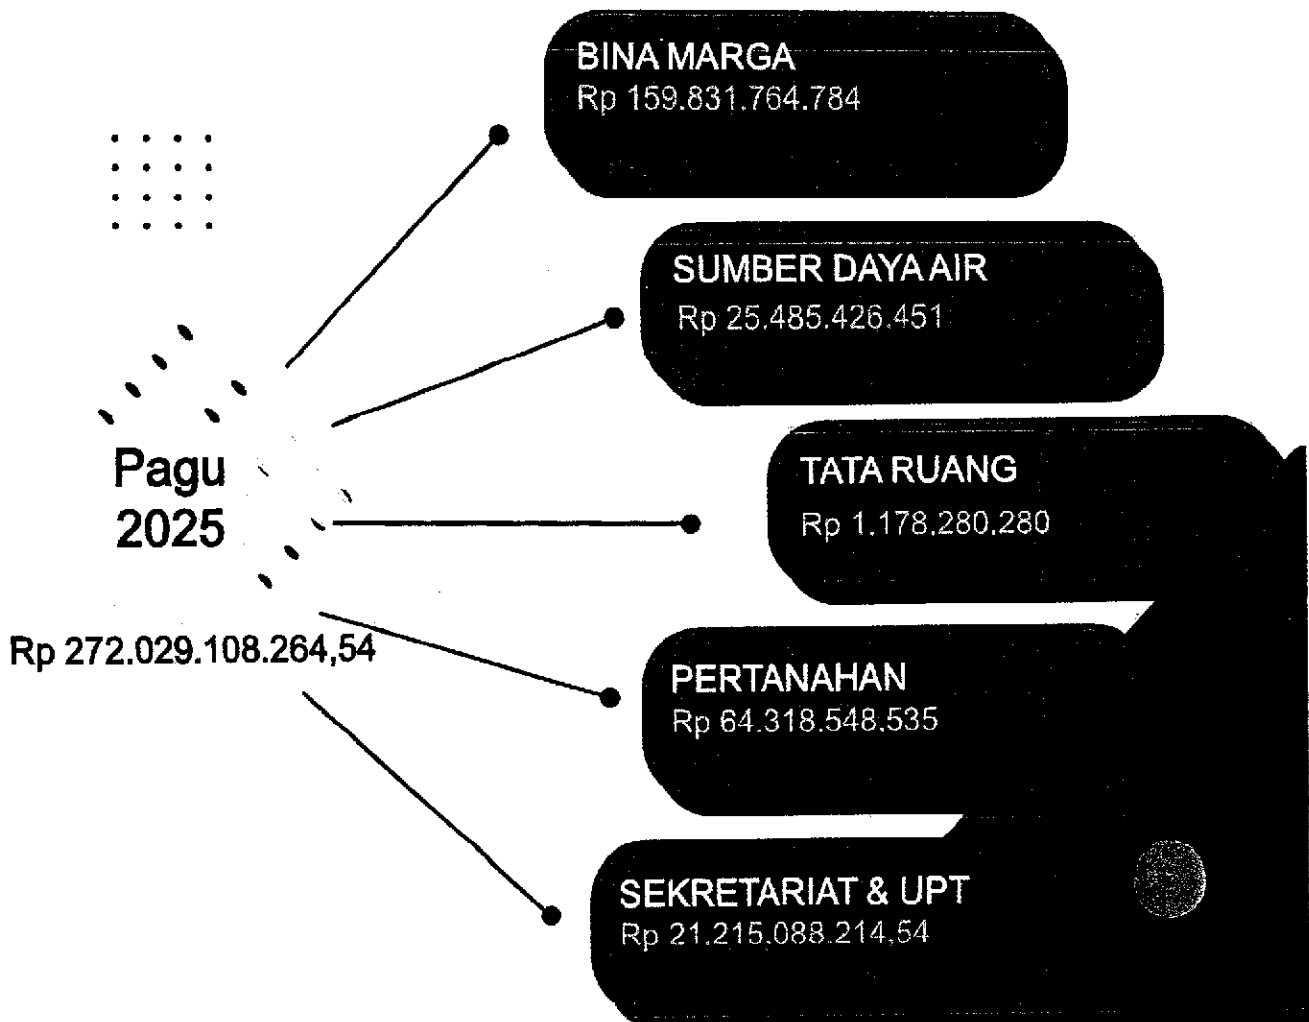


NURMA CHABIBAH, S.E

LAPORAN HASIL EVALUASI

PROGRES PELAKSANAAN KEGIATAN APBD TA 2025 *sampai dengan* SEMESTER I

DINAS PUTR KAB. GRESIK



Target & Realisasi s.d Semester I

PENDAPATAN

Target : 25%

Realisasi : 8,94%

(16,06%)

Pekerjaan fisik belum
semuanya terlaksana

BELANJA OPERASI :

FISIK

Target : 28,44%

Realisasi : 10,62%

(17,82%)

KEUANGAN

Target : 31,45%

Realisasi : 9,19%

(22,26%)

Rekap Paket 2025 DPUTR

BIDANG	TENDER		PL		E-Catalog	Swakelola
	Fisik	Konsultan	Fisik	Konsultan		
SDA	14	2	11	31	13	2
BM	30	6	57	82	6	0
TARU	0	2	0	8	0	0
PERTANAHAN	0	0	0	10	0	3
TOTAL	44	10	68	131	19	5

BINA MARGA

	Total	RPP	Review BLP / INSPEKTORAT	Masa Sanggah	Berkontrak	Berjalan / Selesai
Total PL Konsultan	82	57	25			
E-catalog	6	2				4
Total PL Fisik	57	50			7	
Total Tender Konsultan	6			3	3	
Total Tender Fisik	30	5	17	2	6	
Total	181	114	42	5	16	4

BINA MARGA

No	Uraian Paket	Pagu	Progress
1	Pelebaran Jalan Metatu - Balongpanggang	6.069.765.268	Berkontrak tanggal 01 Juli 2025
2	Peningkatan Jalan Morowudi - Benjeng	6.769.765.268	Berkontrak tanggal 01 Juli 2025
3	Peningkatan Jalan Klotok - Babatan	4.084.732.000	Berkontrak tanggal 06 Mei 2025
4	Peningkatan Jalan Bringkang - Lampah	3.900.135.000	Berkontrak tanggal 08 Mei 2025
5	Rekonstruksi Jalan Banjarsari - Gedangkulut	2.986.911.600	Berkontrak tanggal 09 Mei 2025
6	Peningkatan Jalan Domas - Gluranploso	5.254.128.390	Berkontrak tanggal 09 Mei 2025
7	Pelebaran Jalan Kesambenkulon - Pernerig	1.920.335.000	Evaluasi Penawaran Tender oleh BLP
8	Pelebaran Jalan Yosowilangun - Suci	2.000.000.000	Evaluasi Penawaran Tender oleh BLP
9	Pelebaran Jalan Sidayu - Randuboto	2.028.201.000	Evaluasi Penawaran Tender oleh BLP
10	Rekonstruksi Jalan Kesamben Wetan - Banjaran	2.420.335.000	Evaluasi Penawaran Tender oleh BLP
11	Pelebaran Jalan Duduksampeyan - Metatu	6.769.765.268	Evaluasi Penawaran Tender oleh BLP
12	Pelebaran Jalan Bulurejo - Randegan	2.908.476.000	RP3
13	Peningkatan Jalan Cermelur - Punduttrate	4.094.654.000	RP3
14	Rehabilitasi Dermaga Apung Bawean	1.872.859.950	Menunggu Rivi BLP
15	Pemeliharaan Rutin Jalan Sekapuk - Banyuurip	852.490.000	Proses Dokumen Persiapan Purchasing
16	Pemeliharaan Rutin Jalan Bungah - Dukun	1.199.762.000	Proses Dokumen Persiapan Purchasing
17	Pemeliharaan Rutin Jalan Lasem - Lowayu	1.799.643.000	Proses Dokumen Persiapan Purchasing
18	Pembangunan Jembatan Kemorogan	800.655.970	Menunggu Reviu DPP
19	Peningkatan Jalan Pantenan - Bluri	1.800.000.000	Tayang di BLP
20	Pelebaran Jalan Menganti - Lakarsantri	2.000.000.000	Tayang di BLP
21	Pembangunan Jembatan Sumberrame	2.650.229.170	Tayang di BLP
22	Pelebaran Jalan Panceng - Lowayu	2.911.636.000	Tayang di BLP
23	Peningkatan Jalan Kedungrukem - Lundo	3.408.476.000	Tayang di BLP
24	Pelebaran Jalan Balongpanggang - Mojopuro	3.556.423.789	Tayang di BLP
25	Peningkatan Jalan Banter - Kalipadang	3.974.646.966	Tayang di BLP
26	Peningkatan Jalan Cermen - Slempit	4.094.654.000	Tayang di BLP
27	Peningkatan Jalan Dungus - Dampaan	4.408.476.000	Tayang di BLP
28	Pelebaran Jalan Bringkang - Menganti	5.922.934.330	Tayang di BLP
29	Pembangunan Oprit Jembatan Kemudi	6.546.802.315	Tayang di BLP
30	Pelebaran Jalan Duduksampeyan - Betoyoguci	8.741.253.000	Menunggu Reviu DPP



SUMBER DAYA AIR

	Total	RPP	Review BLP / INSPEKTORAT	Masa Sanggah	Berkontrak	Berjalan / Selesai
E-Catalog Barang	13	1				12
Total PL Konsultan	31	22			2	7
Total Swakelola	2	1				1
Total PL Fisik	11	11				
Total Tender Fisik	14	3	9		2	
Total Tender Konsultan	2	1				1
Total		39	9	0	4	21



SUMBER DAYA AIR

No	Uraian Paket	Pagu	Progress
1	Pemeliharaan Retarding Basin	200.000.000	Penyiapan Dokumen Pengadaan
2	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Ngabetan	400.000.000	BERKONTRAK
3	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Pacuh	454.250.000	BERKONTRAK
4	Rehabilitasi Waduk Ketanen	200.000.000	Proses Pengadaan
5	Rehabilitasi Waduk Petung	200.000.000	Proses Pengadaan
6	Rehabilitasi Pintu Air Karangan Kidul	300.000.000	Proses Review oleh BLP
7	Rehabilitasi Pintu Air Kali Corong	300.000.000	Proses Review oleh BLP
8	Rehabilitasi Pintu Air Kali Padang	300.000.000	Proses Review oleh BLP
9	Rehabilitasi Waduk Brangkal	300.000.000	Proses Review oleh BLP
10	Rehabilitasi Waduk Kedamean I	300.000.000	Proses Review oleh BLP
11	Rehabilitasi Waduk Tlogogede	300.000.000	Proses Review oleh BLP
12	Rehabilitasi Waduk Bangle	400.000.000	Proses Review oleh BLP
13	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Waduk Kedamean I	400.000.000	Proses Review oleh BLP
14	Rehabilitasi Waduk Ngepung I	400.115.000	Proses Review oleh BLP

TATA RUANG

No	Paket	Pagu	Progress
1	Penyusunan Peraturan Terkait Penetapan Garis Sempadan	85.000.000,00	Berkontrak tanggal 15 April 2025
2	Pendampingan Bimbingan Teknis Matek dan Ranperbup RDTR WP Kedamean	85.000.000,00	Berkontrak tanggal 24 Juni 2025
3	Pendampingan Lintas Sektor RDTR WP Driyorejo	85.000.000,00	Berkontrak tanggal 03 Juli 2025
4	Penyusunan KLHS RDTR WP Bungah	85.000.000,00	Proses Pengadaan
5	Penyusunan KLHS RDTR WP Duduksampeyan	85.000.000,00	Proses Pengadaan
6	Penyusunan Materi Teknis RDTR WP Bungah	127.000.000,00	Berkontrak tanggal 02 Juni 2025
7	Penyusunan Materi Teknis RDTR WP Duduksampeyan	127.000.000,00	Berkontrak tanggal 02 Juni 2025
8	Pemutakhiran Aplikasi GOPUTAR Tahun 2025	85.000.000,00	Berkontrak tanggal 02 Mei 2025
9	Jasa Konsultasi Penilaian Perwujudan RDTR Manyar Bungah	57.000.000,00	Berkontrak tanggal 25 April 2025
10	Penyusunan materi desiminasi pengendalian pemanfaatan ruang	57.000.000,00	Berkontrak tanggal 03 Juni 2025



PERTANAHAN

No	Uraian Paket	Pagu	PROGRESS
1	Pengadaan Tanah untuk Pelebaran Menganti - Lakarsantri	24.142.272.000	Proses pengumpulan berkas dan rencana pengukuran oleh BPN
2	Pengadaan Tanah untuk Pelebaran Kemudi - Betoyoguci	5.000.000.000	Proses reviu penyusunan DPPT
3	Pengendalian Banjir Kali Lamong (Pembangunan Kolam Retensi)	20.000.000.000	Proses pemenuhan kekurangan berkas untuk pengurusan Peta Bidang Tanah oleh BPN
4	Waduk Irigasi Lumbung Air Sukodono	2.380.000.000	Proses penyusunan daftar nominatif
5	Pengendalian Banjir Kali Lamong (Tanggul)	10.220.600.000	Proses pemasangan tanda batas

REKAPITULASI BANTUAN KEUANGAN TA 2025

KATEGORI : Infrastruktur Jalan/ Saluran/ Plengsengan Jalan Poros Desa
Pagu : Rp 15.197.500.000

KETERANGAN	KEGIATAN	CAIR	BELUM CAIR
SP2D TAHAP 1	20	1.977.500.000	1.977.500.000
PENGAJUAN KE BPPKAD	41		6.240.000.000
PERBAIKAN BERKAS DI DESA	17		3.032.500.000
BELUM VERIFIKASI	12		1.970.000.000
TOTAL	90	1.977.500.000	13.220.000.000

TERIMAKASIH

Dinas_putr

pemerintah_kab_gresik

